

2025-09-15

Til beboerne i boligforeningen Kronjylland afd. 27 Skansegaarden



Billede 1



Billede 2



Billede 3

Generelt

Byggeriet skrider frem efter planen og der er mange aktiviteter i gang på pladsen.

Der er på nuværende tidspunkt ca. 100 håndværkere på pladsen.

I løbet af september vil de første to opgange blive overdraget til boligforeningen og de første beboere vil kunne flytte ind.

Afdeling 8B (Bøsbrovej) 51A og 51B samt 49A og 49B.

Billede 1 og 2:

Opgang 51A og 51B er færdige indvendig men altanerne mangler stadig at få monteret glas.

Slutmontering af VVS er i gang i opgang 49A og 49B

Indgangspartier og de lukkede altaner er ved at blive opsat.

Elevatore er indbygget og er ved at gennemgå en godkendelsesproces.

Udenfor er anlægsfolkene startet op på belægningerne. Startende ved gavlen ved 51B.


Afdeling 8A (Bøsbrovej) 47A og 47B samt 45A og 45B.

Billede 3:

Opmuring af skalmure er ved at være færdigt

Køkkener er ved at blive opsat

Den nye tagkonstruktion tager form.

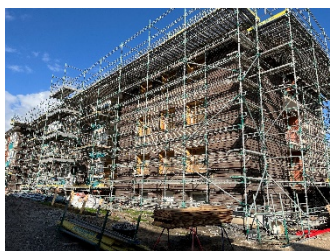

Billede 4



Billede 5



Billede 6

Afdeling 9B (Bøsbrovej) 43A og 43B samt 41A og 41B.

Billede 4: Grundet asbestsanering i kælderen kan beboerne ikke benytte kælderen i denne uge. Adgang til opgangene vil foregå via gangstier hvor der er opsat gult hegn for at adskille gangareal for beboere fra byggepladsen. Gangstier for beboere vil blive tilrettet.

Omlægning af vand og kloak er færdiggjort og fundamenter for skalmuren er støbt. Arbejdet med skalmuring er godt i gang.

Afdeling 9A (Bøsbrovej) 39A og 39B samt 37A og 37B.

Billede 5: Indgangen til blokken går gennem kælderen ved 37A. Dette skyldes udgravning ved eksisterende indgange som vil være aflåste i den periode hvor der udføres anlægsarbejder. Der vil blive varslet mht. at der blive saneret for asbest i kælderen.

Altanerne vil i de næste dage blive nedbrudt og stilladset for opmuring af skalmur opsættes.

Afdeling 8C (Vorupboulevard) 44 og 46.

I de næste uger vil der blive gravet en del udenfor bygningen for at omlægge kloak og gøre plads til at støbe fundamenter.

Afdeling 6B (Nørresundbyvej) 28, 26, 24 og 22.

Billede 6: Byggepladshegn er opsat og nedbrydningen er begyndt.

I de næste uger vil der blive gravet en del udenfor bygningen for at omlægge kloak og gøre plads til at støbe fundamenter.
