

2025-11-19

Til beboerne i boligforeningen Kronjylland afd. 27 Skansegaarden



Billede 1



Billede 2



Billede 3

Generelt

Byggeriet skrider frem efter planen og der er mange aktiviteter i gang på pladsen.

Der er på nuværende tidspunkt ca. 120 håndværkere på pladsen.

Enkelte opgange (Bøsbrovej 51A og 51B) er overdraget til boligforeningen og de første beboere er flyttet ind.

Afdeling 8B (Bøsbrovej) 51A og 51B samt 49A og 49B.

Billede 1 og 2:

Opgang 51A og 51B er færdige indvendig men altanerne mangler stadig at få monteret glas. Slutmontagen af altanerne i disse opgange pågår.

Indgangspartier og de lukkede altaner er ved at blive opsat.

Udenfor er anlægsfolkene ved at være færdige med belægningerne.

Man satser på at P-pladserne kan anvendes inden jul.


Afdeling 8A (Bøsbrovej) 47A og 47B samt 45A og 45B.

Billede 3:

Opgang 47A og 47B vil blive overdraget til RandersBolig i november.

Altaner mangler stadig at blive færdiggjort.

Belægningsarbejdet forventes færdigt i indeværende måned.

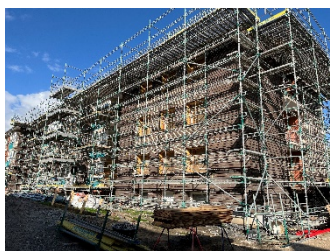

Billede 4



Billede 5



Billede 6

Afdeling 9B (Bøsbrovej) 43A og 43B samt 41A og 41B.

Billede 4: Adgang til opgangene vil foregå via gangstier hvor der er opsat gult hegn for at adskille gangareal for beboere fra byggepladsen. Gangstier for beboere vil blive tilrettet.

Arbejdet med skalmuring er færdigt.

Stilladset vil blive stående lidt endnu da det skal bruges til det nye tag.

Afdeling 9A (Bøsbrovej) 39A og 39B samt 37A og 37B.

Billede 5: Indgangen til blokken går gennem kælderen ved 37A. Dette skyldes udgravning ved eksisterende indgange som vil være aflåste i den periode hvor der udføres anlægsarbejder.

Gangstier er etableret udenfor hvor opgangsdørerne vil kunne benyttes.

Stilladset for opmuring af skalmur opsættes i takt med opmuringen.

Afdeling 7A Vorup Boulevard 28 – 34

Der vil i den næste periode blive udgravet for at støbe fundamenter for de nye skalmure.

Afdeling 7B Vorup Boulevard 36 – 42

Fra uge 48 vil der blive opsat byggepladshegn.

Afdeling 6B (Nørresundbyvej) 28, 26, 24 og 22.

Billede 6: Byggepladshegn er opsat og nedbrydningen er begyndt.

I de næste uger vil der blive gravet en del udenfor bygningen for at omlægge kloak og gøre plads til at støbe fundamenter.
